



Karrebæk, Vesterhave og Reedtzholm vandværk
V/ Flemming Enggaard
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde

Mail: Flemming Enggaard: drift@kvand.dk og Stig Elholm
formand@kvand.dk

Team Vand og Natur

Næstved Kommune
5588 5588

www.naestved.dk

Tilsyn Karrebæksminde, Vesterhave og Reedtzholm vandværk 2021

Næstved Kommune ved Pia S. Petersen foretog den 20. august 2021 tilsyn med Karrebæk, Vesterhave og Reedtzholm vandværk. Tilstede ved tilsynet fra vandværkerne var Flemming Enggaard tlf. nr. 23711342 og Stig Elholm tlf. nr. 40285288.

Dato
23-8-2021

Sagsnr.
13.02.01-K08-11-21

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

CPR-nr.

Karrebæk vandværk

- Der mangler DGU skilt i boring 4 med DGU nr. 221.960
- BNBO, aftale for boring med DGU nr. 221.425, 221.825 og 221.1042 blev drøftet og det blev aftalt, at vandværket underretter Næstved Kommune når der er forligger et udkast til aftalte med lodsejeren.

Sagsbehandler
Pia Diana Skov Petersen
+4555886168

Vesterhave vandværk

- BNBO, aftale for boring med DGU nr. 221.826 blev drøftet og det blev aftalt, at vandværket underretter Næstved Kommune når der er forligger en aftalte med lodsejeren.

Reedtzholm vandværk

- Der mangler lås på boring 3, 5 og 7.

Karrebæk, Vesterhave og Reedtzholm vandværker samt tilhørende boringer vurderes at være i god stand.

Tilsynsnotat

Karrebæk vandværk leverer vand til 2.231 forbrugere, Vesterhave vandværk til 982 forbrugere og Reedtzholm vandværk til 942 forbrugere.

Karrebæk vandværk har en indvindingstilladelse til indvinding af 120.000 m³ grundvand pr. år. Vandværket har indberettet et forbrug på 102.307 m³ for år 2020. Tilladelsen udløber oktober 2047.

Vesterhave har en indvindingstilladelse til indvinding af 50.000 m³ grundvand pr. år. Vandværket har indberettet et forbrug på 28.207 m³ for år 2020. Tilladelsen udløber oktober 2047.



Reedtzholm har en indvindingstilladelse til indvinding af 60.000 m³ grundvand pr. år. Vandværket har i 2020 indberettet et vandforbrug på 57.756 m³. Tilladelsen udløber den 20.04.2050.

Indberetning af vandmængder og pejledata.

Vandværket har indberettet vandmængder og pejledata for Karrebæk, Vesterhave og Reedtzholm vandværker.

Kontrolplan

Vandværket har modtaget kontrolplaner, som er gældende for år 2018 til 2022. Vandværket har sendt en kopi af kontrolplanen til akkrediteret laboratorium. Karrebæk og Vesterhave vandværk får udtaget prøver fra Eurofins Laboratorie og Reedtzholm vandværk får udtaget prøver fra ALS (tidligere TjekVand).

Vandkvaliteten

Karrebæk, Vesterhave og Reedtzholm vandværk har i vandprøverne udtaget i 2021 ikke haft overskridelse af gældende kravværdier.

Vandbehandlingen fungerer og der produceres en tilfredsstillende vandkvalitet på alle tre værker.

Generelt for alle tre vandværker er det vigtigt, at indvindingen foregår så jævnt som muligt, for at udgå at trække for hårdt på grundvandsmagasinet, hvilket kan medføre forhøjede koncentrationer af de kemiske stoffer, som f.eks. klorid, fluorid, nikkel og arsen i råvandet.

Ringforbindelse

Karrebæk, Vesterhave og Reedtzholm vandværk er ringforbundet.

Ledningsnet

Ledningsnettet består af PVC /PEL og PEM slanger. Der er en strækning i Karrebækstorp området, som består af jernledning. Ledningsnettet udskiftes efter behov.

Vandspild på ledningsnettet

Vandforbruget på de 3 vandværker følges dagligt, for at minimere vandspild på ledningsnettet.

Beredskabsplan

Beredskabsplanen ligger på vandværkerne. Kopi af beredskabsplan blev udleveret ved tilsynet.

Drift og hygiejnekursus

Flemming Enggaard har gennemført drift og hygiejnekursus i 2013.

Kvalitetssikring

De 3 vandværker styres vha. SRO -anlæg.

Takstblad

Takstblad 2021 for de tre vandværker er godkendt.



Termografering af vandværkerne

Der er udført termografering af eltavlerne i 2020. Kopi af termografirapport 2020 på de tre værker blev udleveret ved tilsynet. Termografering foretages hvert 2 år.

Vandmålere

Alle vandmålere vil i løbet af 2021 være udskiftet med Kamstrup vandmålere, som kan fjernaflæses. Der udtages stikprøve af målerne hvert 8 år.

Hjemmeside

Vandværket har en hjemmeside – www.kvand.dk, hvor man bl.a. kan læse om information om kontaktoplysninger, driftsstatus, vandkvalitet, takstblad m.m.

Orientering til forbrugerne

Forbrugerne orienteres om vandkvaliteten på hjemmesiden samt ved indkaldelse til generalforsamling. Opstår der akutte problemer orienteres forbrugerne via sms.

Vedligeholdelsesplan.

De tre vandværker vedligeholdes løbende.

Boringer

Alle boringerne tilhørende de 3 vandværker blev tilset.

BNBO

Boringsnære beskyttelsesområde – BNBO blev drøftet.


Karrebæk/ Karrebæksminde vandværk

Næstved kommune har i oktober 2020 indberettet til Miljøstyrelsen, at Karrebæk vandværkets 5 boringer med DGU nr. 221.968, 221.960, 221.46, 221.425, 221.825 og 221.1042 er risikovurderet og pt. er det vurderet, at der på boringerne med **DGU nr. 221.425, 221.825 og 221.1042** skal der forsøges at opnå en frivillig aftale med hensyn til Pesticider.

På boring med DGU nr. 221.968, 221.960 og 221.46 er det pt. vurderet, at der ikke er behov for indsats med hensyn til pesticider.




Kort med BNBO for og 25 meters fredningszone for boring med DGU nr. 221.425 og 221.825 Karrebæk/ Karrebæksminde vandværk.

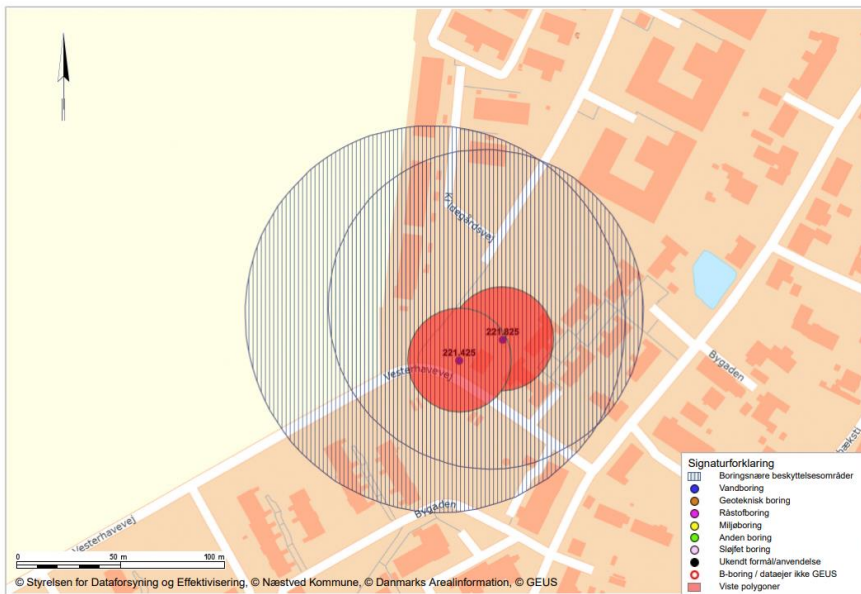



Kort med BNBO for og 25 meters fredningszone for boring med DGU nr. 221.1042
Karrebæk/ Karrebæksminde vandværk.

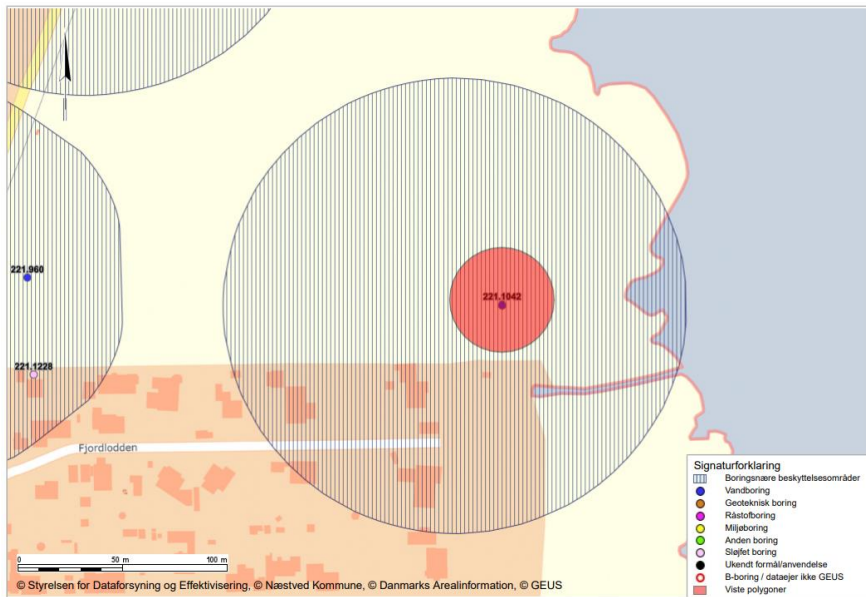




Vesterhave vandværk

Næstved kommune har i oktober 2020 indberettet til Miljøstyrelsen, at Vesterhave vandværkets 2 borer med DGU nr. 221.826 og 221.1052 er risikovurderet og pt. er det vurderet, at der på borerne med **DGU nr. 221.826** skal der forsøges at opnå en frivillig aftale med hensyn til Pesticider.

På boring med DGU nr. 221.1052 er det pt. vurderet, at der ikke er behov for indsats med hensyn til pesticider.

Kort med BNBO for og 25 meters fredningszone for boring med DGU nr. 221.826 og 221.1052 for Vesterhave vandværk.

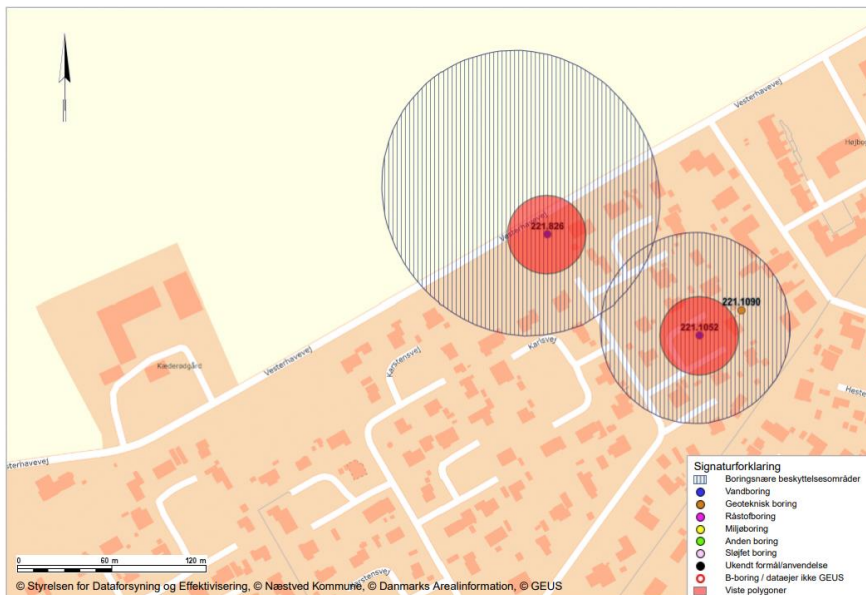

**Reedtzholm vandværk**

Næstved kommune har i oktober 2020 indberettet til Miljøstyrelsen, at Reedtzholm vandværkets 5 boringer med DGU nr. 221.949, 221.654, 221.932, 221.682, 221.854, 221.933, 221.871 og 221.999 er risikovurderet og pt. vurderet, at der ikke er behov for indsats med hensyn til pesticider.

Det blev oplyst, at vandværket vil tage kontakt til de berørte lodsejere for aftale om pesticidfri drift i BNBO -områderne ved boring med DGU nr. 221.425, 221.825 og 221.1042 tilhørende Karrebæk vandværk og 221.826 tilhørende Vesterhave vandværk.

Vandværket underretter Næstved Kommune når der er forligget en aftale med lodsejeren.

Lovgivning

Tilsynet er ført i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, kapitel 5.

Venlig hilsen

Pia Diana Skov Petersen
Miljøtekniker

Kopi: Miljøstyrelsen mst@mst.dk



Karrebæk vandværk

Vesterhavevej 8, 4736 Karrebæksminde		
Antal forbrugere i alt: 1.307	Husstande Sommerhuse Landbrug m/ dyr Virksomheder Institutioner	819 427 44 17 herunder camping, restauranter, skole og børneinstitutioner.
Indvindingsmængde pr. år	Tilladelse: 120.000 m³	Udløber den 06.02.2047
Indberettet vandmængde	2020	102.307 m ³
Pejledata	Ja/nej	2021
Godkendt takstblad	Ja/nej	2021
Kontrolplan	Ja/nej	Eurofins

		Ja	Nej	Bemærkninger
Ledelsessystem Kvalitetssikring Senest den 31. dec.2014 <i>(Bek. 132 af 08.02.2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg.)</i>	<i><17.000 m³</i> >17.000 m³ kursus i vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne. <i>750.000 m³ ISO22000 (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed)</i>	X		SRO-anlæg
Drift og hygiejekursus		X		Flemming i år 2013
Foreligger der en vedligeholdelsesplan	Vedligeholdelsesplanen bør omfatte: boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet.	X		Løbende Større vedligehold fremgår af årsregnskabet.
Vandværksbygning	Indhegnet	X		
	Aflåst dør	X		
	Udv. vedligeholdelse god	X		
	Indv. vedligeholdelse god	X		Løftet over filtrene er udskiftet i 2018
	Luftindtag og vent. beskyttet	X		
Behandlingsanlæg	Iltningsstårn	X		
	Trappe			
	Kompressor	X		
	Rislebakke Luftindblæsning			



		Ja	Nej	Bemærkninger
	Fungerer iltningsanlæg	X		
	Fungerer åbne filteranlæg	X		
	Drift – jævn pumpestrategi	X		Der pumpes fra 1 og 4, 2 og 5, 3 og 6.
	Filtermateriale	X		Skiftet sep. 2006
	Antal skylninger pr. uge	X		For hver 300 m ³ udpumpet vand
	Rentvand anv. til skylning	X		Ca. 10 m ³
Rentvandsbeholder, Højdebeholder eller vandtårn	Beliggenhed	X		Under vandværket og foran vandværket er tømt og tilset i 2018
	Volumen			I alt 270 m ³
	Aflåst dør eller lem	X		
	Ventilationsåbning beskyttet	X		
	Utætheder		X	
	Vedligeholdelse god	X		
Spildevand	Slambassin/brønd	X		Tømmes efter behov
	Rottesikring			
	Indhegnet	X		
	Afløb til offentlig kloak	X		
	Afløb til recipient			
	Udledningstilladelse			
	Vedligeholdelse god	X		
Prøveudtagningshane		X		
Ringforbindelse/ledningsnettet		X		Vesterhave vandværk og Reedtzholm vandværk
Beredskabsplan		X		
Nødstrømsforsyning				
Brandhaner		X		
Rentvandspumper	Driftsmæssig god stand	X		I alt 5. stk. 3 stk. 8 kubik og 1 stk. 6 kubik



		Ja	Nej	Bemærkninger
Affugter	-	X		
Doseringsanlæg	-		X	
Vandmålere	-	X		
Kalkknuser		X		
Hydrofor	-		X	
Ventiler og styreorganer	-	X		
Rørledningsanlæg	-	X		
Sikkerhedsforhold	Gode	X		
El-installationer	Gode	X		
Trykforøger			X	

Bemærkninger:

Mappe med Brugervejledning og EI samt Beredskabsplan står på vandværket.



Boring, DGU-nr.: intern nr.:	221.425 1		221.825 2		221.046 3		221.960 4	
	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
Placering: Bygning: Tørbrønd:							X	
Overjordisk råvandsstation	X		X		X			
Fredningsbælte:	X		X		X		X	
Indhegning/Beplantning:	X		X		X		Bep.	
Boring ført til terræn	X		X		X		X	
Tørbrønd opfylder DS 442:	-		-		-		X	
DGU nr. i tørbrønd	X		X		X			X
Aflåst:	X		X		X		X	
Kant over terræn cm:	-		-		-		X	
Omgivelser m/fald bort:	-		-		-		X	
Tæt dæksel m/kant:	X		X		X		X	
Ventilation brønd, dobbelt:	-		-		-		X	
Ventilation brønd, insektsikret	-		-		-		X	
Tætte gennemføringer:	X		X		X		X	
Bund med sump:	-		-		-		X	
Opstående vand i tørbrønd:	-		-		-			X
Forerørsforsegling:	X		X		X		X	
Forerørsforsegling vandtæt:	X		X		X		X	
Råvandspumpe, driftmæssig tilstand god	X		X		X		X	
Pumpestrategi	1/3		1/3		1/3		2/3	
Findes ventilation (Ånderør):	-		-		-			X
Findes pejlestuds (mindst 5 mm):	X		X		X		X	
Automatisk pejling	X		X		X		X	
Pejlinger/år								
Prøveudtagningshane	X		X		X		X	
Alarm	X		X		X		X	

Mangler DGU nr. i boring 4 DGU nr. 221.960



Boring, DGU-nr.: intern nr.:	221.968 5		221.1042 6	
	Ja	Nej	Ja	Nej
Placering: Bygning: Tørbrønd: Overjordisk råvandsstation	X		X	
Fredningsbælte, meter:	X		X	
Indhegning/Beplantning:	Bep.		X	
Boring ført til terræn	X		X	
Tørbrønd opfylder DS 442:	X		X	
DGU nr. i tørbrønd	X		X	
Aflåst:	X		X	
Kant over terræn cm:	X		X	
Omgivelser m/fald bort:	X		X	
Tæt dæksel m/kant:	X		X	
Ventilation brønd, dobbelt:	X		X	
Ventilation brønd, insektsikret	X		X	
Tætte gennemføringer:	X		X	
Bund med sump:	X		X	
Opstående vand i tørbrønd:		X		X
Forerørsforsegling:	X		X	
Forerørsforsegling vandtæt:	X		X	
Råvandspumpe, driftmæssig tilstand god	X		X	
Pumpestrategi	2/3		2/3	
Findes ventilation (Ånderør):		X		X
Findes pejlestuds (mindst 5 mm):	X		X	
Automatisk pejling	X		X	
Pejlinger/år				
Prøveudtagningshane	X		X	
Alarm	X		X	

Bemærkninger:

Indvindingen er fordelt med
 1/3 fra boring 1 og 2/3 fra boring 4
 1/3 fra boring 2 og 2/3 fra boring 5
 1/3 fra boring 3 og 2/3 fra boring 6.
 Boringerne pejles automatisk.

I boring 4, 5 og 6 var der vand i sumpen.



Vesterhave vandværk

Højbovænget 10A, 4736 Karrebæksminde.		
Antal forbrugere i alt: 894	Sommerhuse	790
	Husstande	101
	Landbrug	2
	Virksomheder Institutioner	1
Indvindingsmængde pr. år	50.000 m ³	Udløber den 06.02.2047
Indberettet vandmængde	Ja/nej	28.207 m ³
Pejledata indberettet	Ja/nej	2021
Godkendt takstblad	Ja/nej	2021
Kontrolplan	Ja/nej	Eurofins

		Ja	Nej	Bemærkninger
Ledelsessystem Kvalitetssikring Senest den 31. dec.2014 (Bek. 132 af 08.02.2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg.)	<17.000 m ³ >17.000 m ³ kursus i vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne. 750.000 m ³ ISO22000 (Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed)	X		SRO-anlæg
Drift og hygiejekursus		X		Flemming 2013
Foreligger der en vedligeholdelsesplan	Vedligeholdelsesplanen bør omfatte: boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet.	X		Løbende Større vedligehold fremgår af årsregnskabet.
Vandværksbygning	Indhegnet	X		
	Aflåst dør	X		
	Udv. vedligeholdelse god	X		
	Indv. vedligeholdelse god	X		
	Luftindtag og vent. beskyttet	X		
Iltning	Iltningstårn	X		
	Trappe			
	Kompressor	X		
	Rislebakke Luftindblæsning			
	Fungerer ilttingsanlæg	X		



		Ja	Nej	Bemærkninger
Behandlingsanlæg	Fungerer trykfilteranlæg			
	Fungerer åbne filteranlæg	X		4 parallel forbundne filtre
	Drift – jævn pumpestrategi	X		70% fra boring 1 og 30 % fra boring 2
	Filtermateriale	X		
	Antal skylninger pr. uge	X		Automatisk for hver 600 m ³
	Rentvand anv. til skylning	X		8 m ³
Rentvandsbeholder, Højdebeholder eller	Beliggenhed	X		Under vandværket tilset i 2014
	Volumen			175 m ³
Vandtårn	Aflåst dør eller lem	X		
	Ventilationsåbning beskyttet	X		
	Utætheder		X	
	Vedligeholdelse god	X		
Spildevand	Slambassin/brønd	X		Tømmes efter behov
	Rottesikring			
	Indhegnet	X		
	Afløb til offentlig kloak	X		
	Afløb til recipient			
	Udledningstilladelse			
	Vedligeholdelse god	X		
Prøveudtagningshane		X		
Ringforbindelse/ledningsnettet		X		Karrebæk og Reedtzholm vandværk
Eksport til andet vandværk m³/år				
Beredskabsplan		X		Blev udleveret ved tilsynet
Nødstrømsforsyning		X		
Brandhaner		X		



		Ja	Nej	Bemærkninger
Rentvandspumper	Driftsmæssig god stand	X		5 stk. 8 kubik + 1 stk. natpumpe 6 kubik
Affugter	-	X		
Doseringsanlæg	-		X	
Vandmålere	-	X		
Hydrofor	-		X	
Ventiler og styreorganer	-	X		
Rørledningsanlæg	-	X		
Sikkerhedsforhold	Gode	X		
El-installationer	Gode	X		
Trykforøger		X		Karrebækstorp gl vandværksbygning

Bemærkninger:



Boring, DGU-nr.: intern nr.:	221.826 1		221.1052 2	
	Ja	Nej	Ja	Nej
Placering: Bygning: Tørbrønd: Overjordisk råvandsstation	X		X	
Fredningsbælte, meter:	X		X	
Indhegning/Bep.:	Bep.		Bep.	
Boring ført til terræn	X		X	
Tørbrønd opfylder DS 442:	X		X	
DGU nr. i tørbrønd	X		X	
Aflåst:	X		X	
Kant over terræn cm:	X		X	
Omgivelser m/fald bort:	X		X	
Tæt dæksel m/kant:	X		X	
Ventilation brønd, dobbelt:	X		X	
Ventilation brønd, insektsikret	X		X	
Tætte gennemføringer:	X		X	
Bund med sump:	X		X	
Opstående vand i tørbrønd:		X		X
Forerørsforsegling:	X		X	
Forerørsforsegling vandtæt:	X		X	
Råvandspumpe, driftmæssig tilstand god	X		X	
Pumpestrategi	70 %		30 %	
Findes ventilation (Ånderør):	X		X	
Findes pejlestuds (mindst 5 mm):	X		X	
Automatisk pejling	X		X	
Pejlinger/år	4		4	
Prøveudtagningshane	X		X	
Alarm	X		X	

Bemærkninger:

I boring 2 var der vand i sumpen.



Reedtzholm vandværk

Reedtzholmvej 21A 4736 Karrebæksminde.		
Antal forbrugere i alt: 1.203	Sommerhuse Husstande Landbrug Virksomheder Institutioner	1180 23
Indvindingsmængde pr. år	60.000 m³	Udløber den 20.04.2050
Indberettet vandmængde	Ja/nej	57.756 m ³
Pejledata indberettet	Ja/nej	2017
Godkendt takstblad	Ja/nej	2021
Kontrolplan	Ja/nej	ALS (Tidligere TjekVand)

		Ja	Nej	Bemærkninger
Ledelsessystem Kvalitetssikring Senest den 31. dec.2014 (Bek. 132 af 08.02.2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg.)	<17.000 m ³ >17.000 m ³ kursus i vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne. 750.000 m ³ ISO22000 (Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed)	X		SRO-anlæg
Drift og hygiejnekursus		X		Flemming 2013
Foreligger der en vedligeholdelsesplan	Vedligeholdelsesplanen bør omfatte: boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet.	X		Løbende Større vedligehold fremgår af årsregnskabet.
Vandværksbygning	Indhegnet	X		
	Aflåst dør	X		
	Udv. vedligeholdelse god	X		
	Indv. vedligeholdelse god	X		
	Luftindtag og vent. beskyttet	X		
Iltning	Iltningstårn Trappe Kompressor Rislebakke Luftindblæsning	X		
	Fungerer iltningsanlæg	X		



		Ja	Nej	Bemærkninger
Behandlingsanlæg	Fungerer trykfilteranlæg/ åbent filteranlæg	X		4 parallel forbundne filtre
	Drift – jævn pumpestrategi	X		
	Fungerer tilsætningsanlæg			ingen
	Filtermateriale	X		
	Antal skylninger pr. uge	X		Filtrene skylles på skift for hver 200 m ³
	Rentvand anv. til skylning	X		
Rentvandsbeholder, Højdebeholder eller	Beliggenhed	X		Under vandværket
	Volumen			200 m ³
Vandtårn	Aflåst dør eller lem	X		
	Ventilationsåbning beskyttet	X		
	Utætheder		X	
	Vedligeholdelse god	X		
Spildevand	Slambassin/brønd	X		Tømmes efter behov
	Rottesikring			
	Indhegnet	X		
	Afløb til offentlig kloak	X		
	Afløb til recipient			
	Udledningstilladelse			
	Vedligeholdelse god	X		
Prøveudtagningshane		X		Med skilt
Ringforbindelse/ledningsnettet		X		Karrebæk og Reedtzholm vandværk
Eksport til andet vandværk m³/år				
Beredskabsplan		X		Blev udleveret ved tilsynet
Nødstrømsforsyning			X	
Brandhaner		X		



		Ja	Nej	Bemærkninger
Rentvandspumper	Driftsmæssig god stand	X		3 stk.
Affugter	-	X		
Doseringsanlæg	-		X	
Vandmålere	-	X		
Hydrofor	-	X		
Ventiler og styreorganer	-	X		
Rørledningsanlæg	-	X		
Sikkerhedsforhold	Gode	X		
El-installationer	Gode	X		
Trykforøger			X	

Bemærkninger:



Boring, DGU-nr.: intern nr.:	221.654 1		221.682 2		221.854 3		221.871 4	
	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
Placering: Bygning Tørbrønd	X		X		X		X	
Overjordisk råvandsstation								
Fredningsbælte, 10 m:	X		X		X		X	
Dyrkningsforbud, 25 m	-		-		-		-	
Indhegning/Beplantning:	X		Bep.		Bep.		Bep.	
Tørbrønd (JFR.DS 442):	X		X		X		X	
DGU nr. i tørbrønd	X		X		X		X	
Aflåst:	X		X			X	X	
Kant over terræn cm	X		X		X		X	
Omgivelser m/fald bort:	X		X		X		X	
Tæt dæksel m/kant:	X		X		X		X	
Ventilation brønd, dobbelt:	X		X		X		X	
Ventilation brønd, insektsikret	X		X		X		X	
Tætte gennemføringer:	X		X		X		X	
Bund med sump:	X		X		X		X	
Opstående vand i tørbrønd:		X		X		X		X
Pumpestrategi								
Forerørsforsegling:	X		X		X		X	
Findes ventilation (Ånderør):	X		X		X		X	
Findes pejlestuds (mindst 5 mm):	X		X		X		X	
Automatisk pejling	X		X		X		X	
Pejlinger/år	4		4		4		4	
Prøveudtagningsshane	X		X		X		X	
Alarm	X		X		X		X	



Boring, DGU-nr.: intern nr.:	221.933 5		221.932 6		221.949 7		221.999 8	
	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
Placering: Bygning Tørbrønd	X		X		X		X	
Overjordisk råvandsstation								
Fredningsbælte, 10 m:	X		X		X		X	
Dyrkningsforbud, 25 m	-		-		-		-	
Indhegning/Bep.:	Bep.		Bep.		Bep.		Bep.	
Tørbrønd (JFR.DS 442):	X		X		X		X	
DGU nr. i tørbrønd	X		X		X		X	
Aflåst:		X	X			X	X	
Kant over terræn cm	X		X		X		X	
Omgivelser m/fald bort:	X		X		X		X	
Tæt dæksel m/kant:	X		X		X		X	
Ventilation brønd, dobbelt:	X		X		X		X	
Ventilation brønd, insektsikret	X		X		X		X	
Tætte gennemføringer:	X		X		X		X	
Bund med sump:	X		X		X		X	
Opstående vand i tørbrønd:		X		X		X		X
Pumpestrategi								
Forerørsforsegling:	X		X		X		X	
Findes ventilation (Ånderør):	X		X		X		X	
Findes pejlestuds (mindst 5 mm):	X		X		X		X	
Automatisk pejling								
Pejlinger/år	4		4		4		4	
Prøveudtagningshane	X		X		X		X	
Alarm	X		X		X		X	

Bemærkninger:

Der stod vand i sumpen af boringerne. Det blev oplyst, at boringen jævnligt vil blive tømt for vand.

Boring 3, 5 og 7 mangler lås.
